

 Relatório Diário de Obra (RDO)		Relatório nº	6
Obra		QGBT Chandon 14/07/2025 até 30/09/2025	
Local		BR 470, 224 - Integração, Garibaldi - RS	
Contratada	RTW	Responsável	Guilherme Schvaickardt
Prazo contratual	79 dias		
Prazo decorrido	3 dias		
Prazo a vencer	76 dias		

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☁️ Nublado	Praticável

Mão de obra (7)					
Eletricista Júnior	Eletricista Pleno	Supervisor			<i>Mão de Obra Própria (7)</i>
3	3	1			



Equipamentos (3)					
PTA Tesoura 12 metros	PTA Articulada 12 m elétrica	PTA Articulada 10 metros			
1	1	1			


Atividades (8)	
Diálogo de Segurança e APR.	100% - Concluída
Organização do local de trabalho	Concluída
Instalar suportes na área externa	Concluída
Instalar eletrocalhas G.E no corredor da sala de prensas	70% - Em Andamento
Avaliar possibilidade da substituição das eletrocalhas existentes por inox	60% - Em Andamento
Avaliar fazer reforço do leito no canto da espumatização - com mão francesa INOX	Em Andamento
Medir e contar as pernas dos cabos 240mm ²	Em Andamento
Chegada das peças do reforço estrutural do piperack	Em Andamento

Ocorrências (2)	
PTA articulada 10m não funciona no corredor do túnel, acusa desnível. <small>Falta de equipamento</small>	
Infraestrutura da espumatização acusando tensão no leito.	

Comentários (1)	
Régis Paiva	16/07/2025 15:39
Chegada de eletrocalhas aramadas para a infraestrutura do QGBT novo.	


Fotos (20)	

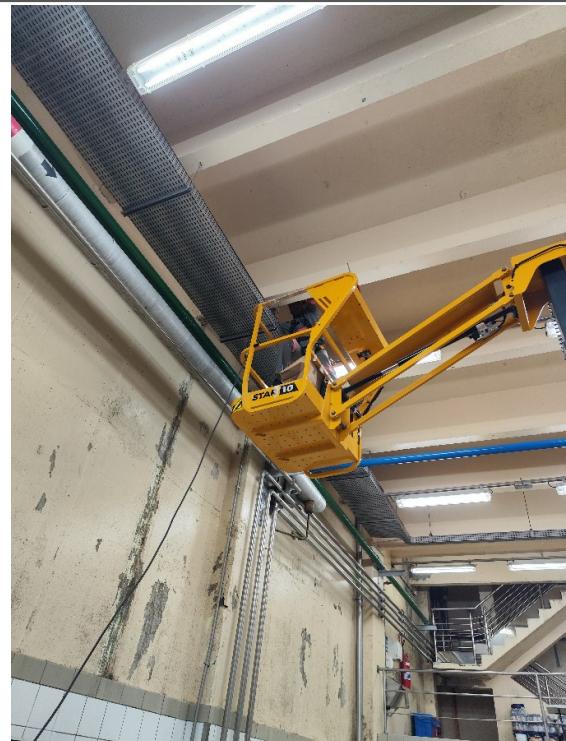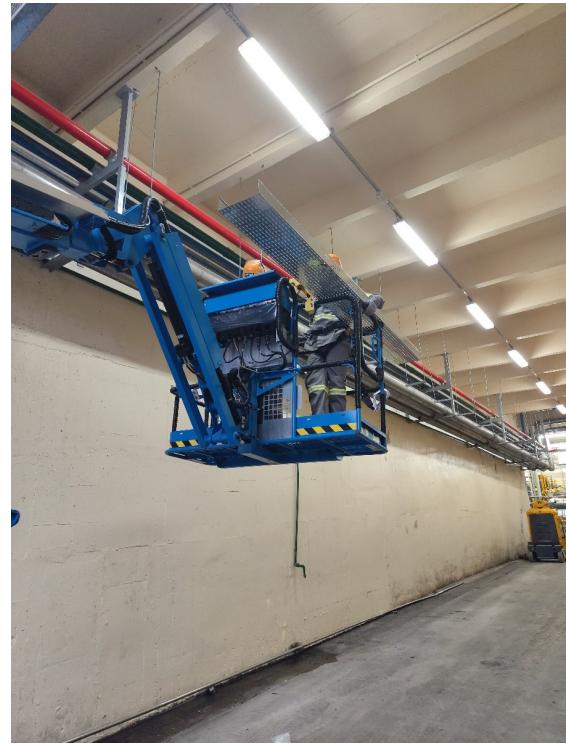

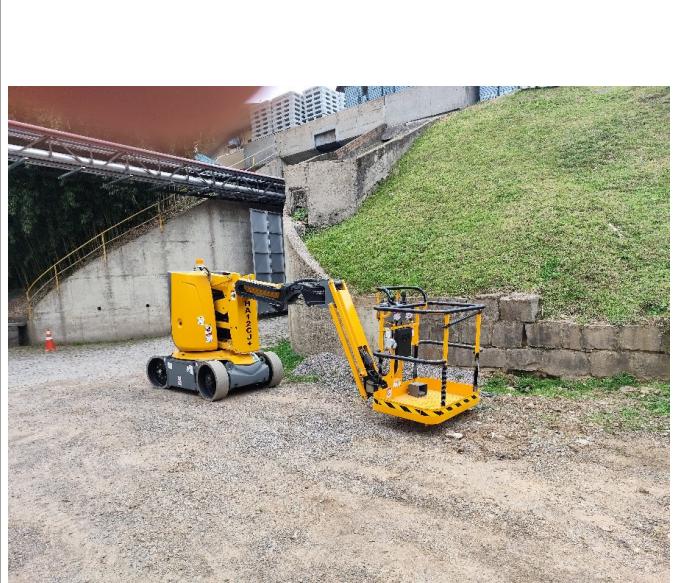

PTA articulada não funciona no túnel por conta do desnível no local.



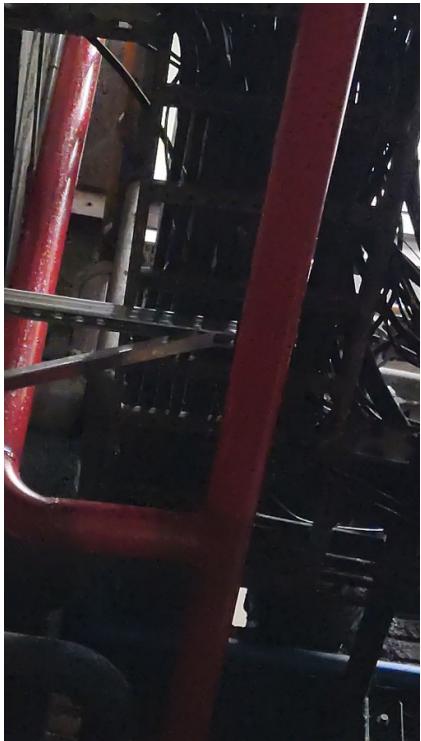





Vídeos (4)

Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:06
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:18
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:06

D

Assinatura

Assinatura

6 / 6
