

 <p>RTW E N G E N H A R I A</p>		Relatório n°	11
		Data do relatório	23/07/2025
Relatório Diário de Obra (RDO)		Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	QGBT Chandon 14/07/2025 até 30/09/2025		Contrato
Local	BR 470, 224 - Integração, Garibaldi - RS		Prazo decorrido
Contratada	RTW	Responsável	Guilherme Schvaickardt
Prazo a vencer	79 dias		69 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (8)					
Eletricista Júnior 3	Eletricista Pleno 3	Supervisor 1	Engenheiro 1		<i>Mão de Obra Própria (8)</i>


Equipamentos (3)					
PTA Tesoura 12 metros 1	PTA Articulada 12 m elétrica 1	PTA Articulada 10 metros 1			


Atividades (6)	
Medir e contar as pernas dos cabos 240mm ²	50% - Em Andamento
Instalar eletrocalhas na parte externa G.F.	90% - Em Andamento
Testar Sentido de Giro dos painéis com auxílio de fasímetro.	30% - Em Andamento
Megar os cabos que alimentam o QGBT	Em Andamento
Preparar instalação do disjuntor geral no QGBT	Em Andamento
Verificar parte interna da subestação para preparar os desligamentos futuros	Em Andamento



Ocorrências (1)	
Calhas galvanizadas a fogo chegarão na obra agora	


Comentários (2)	
Thomas 23/07/2025 14:18	Sentido de giro do QDF-03 e QDF-07, expedição e engarrafamento respectivamente. Sentido horário
Thomas 23/07/2025 14:19	Não testamos o sentido de giro dos demais pois estavam lacrados os painéis e necessitava desligamento


Fotos (20)	

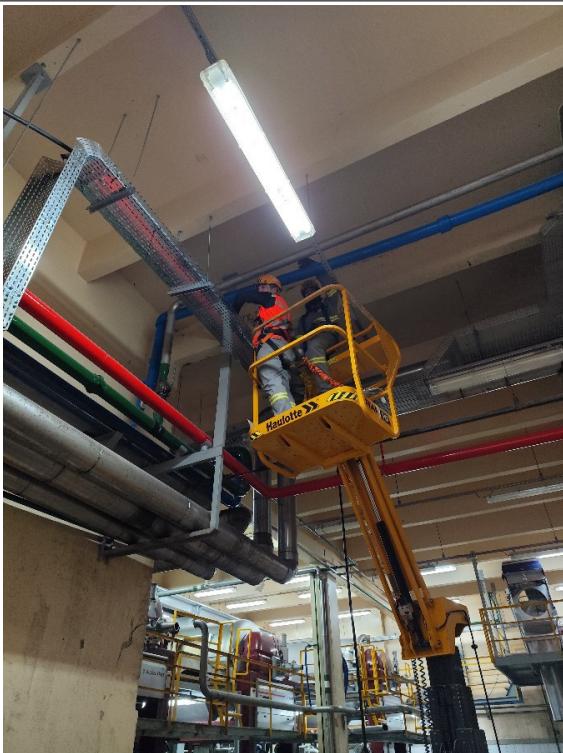

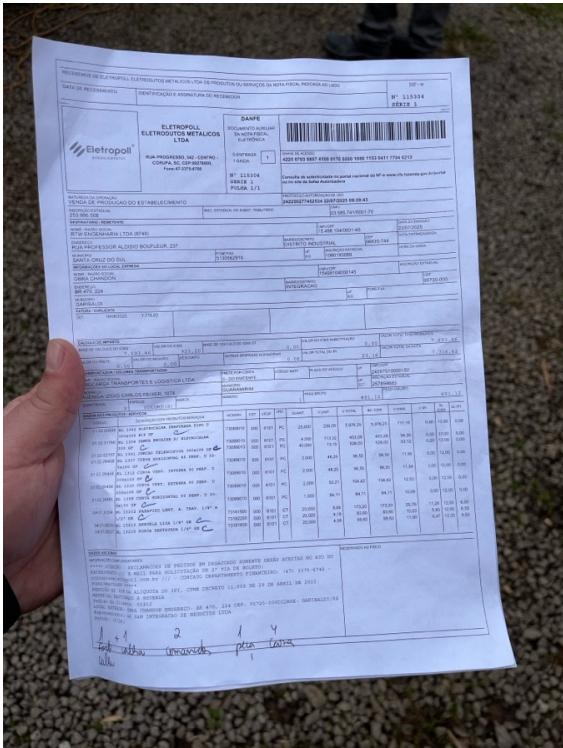

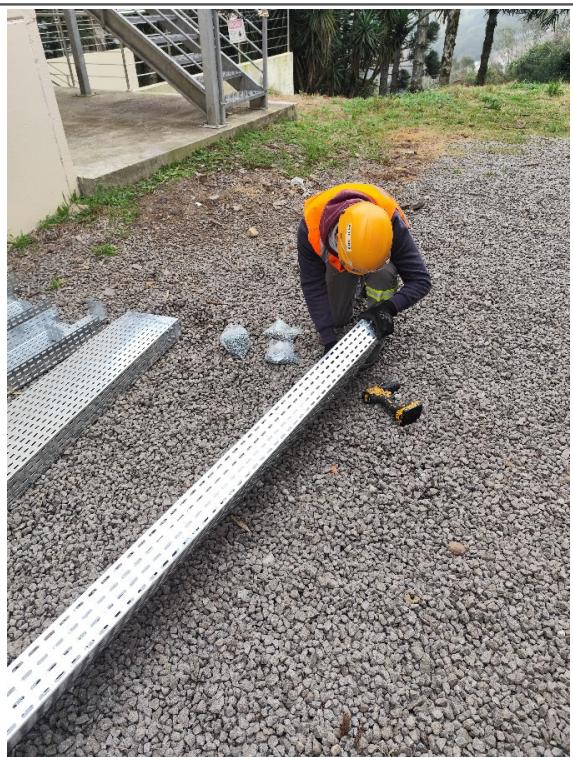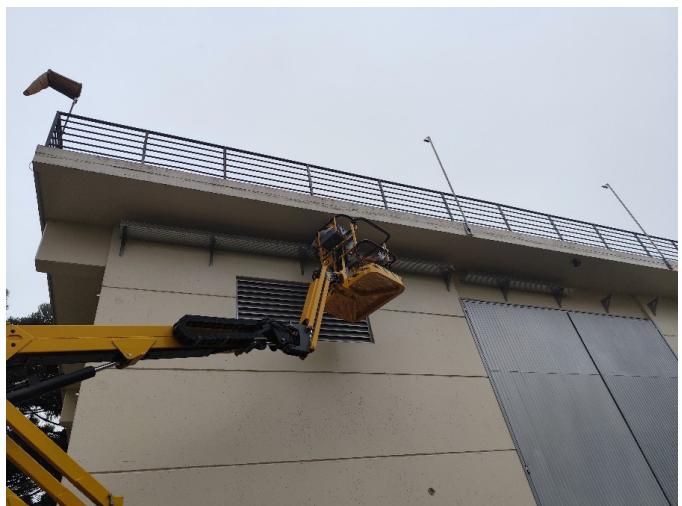

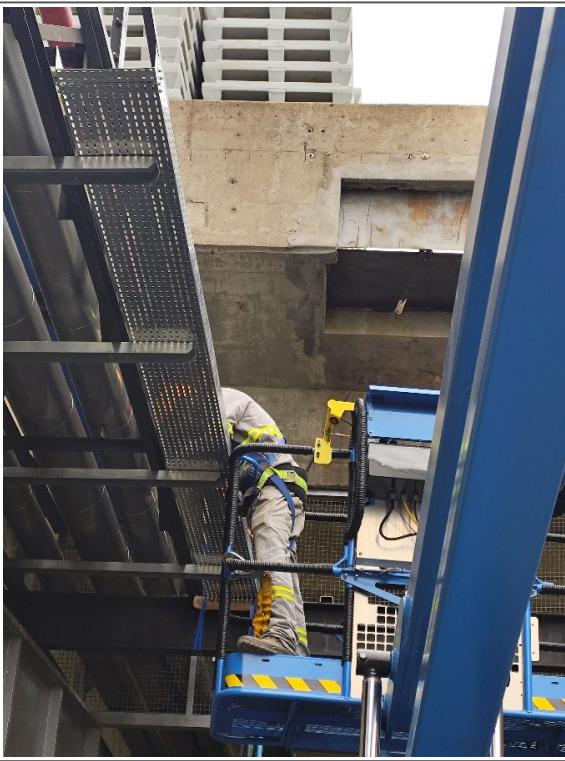

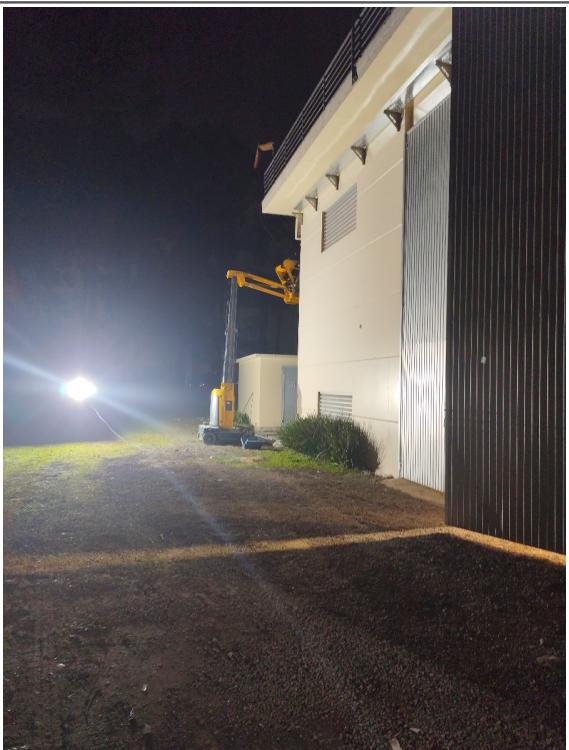

Vídeos (3)

Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:10
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:07

Assinatura

Assinatura

6 / 6
